




## Novidades P6 Interface Web

### Melhorias na função de busca e substituição global (Global Serch and Replace)

Esta função possui novas características na versão 16.1, que fornecem um melhor controle sobre as modificações nos dados de sua organização.



Novos agrupamentos foram adicionados para distinguir os templates (Usuário ou Global) na tela de seleção de templates. Os templates globais ficam disponíveis a todos os usuários, já os templates de usuário, apenas ao usuário corrente. Recorte e cole templates através destes grupos ou clique no botão “Make Global” para mover um template de usuário para global.

Na tela de critérios de busca do Global Serch and Replace, os critérios de pesquisa podem ser agrupados, ou seja, permitem que você busque por um único campo ou vários ao mesmo tempo.


Modifique campos no nível de detalhe de alocações de recursos, por exemplo: Nome do Recurso, ID do Recurso, Nome do Role, ou ID do Role. Na tela de revisão de mudanças, escolha quais colunas exibir. Clique no checkbox na opção Include Column para selecionar ou remover todas as linhas ao mesmo tempo.

Para acessar esta função: No menu Actions da visão de EPS, clique em **Global Serch and Replace**.

## Visualizar o gráfico de utilização da equipe em uma escala diária

O P6 16.1 permite que você visualize os dados de utilização da equipe e informações de custo em uma escala de tempo diária.

Observando as alocações de recursos na forma de planilha ou o histograma em uma escala de tempo semanal, podemos verificar níveis normais de alocação. Entretanto, alguns dias em meio a este período podem estar superalocados em termos de esforço ou custos. A escala de tempo diária permite que você visualize se existem recursos ou roles superalocados em um nível de detalhamento diário.

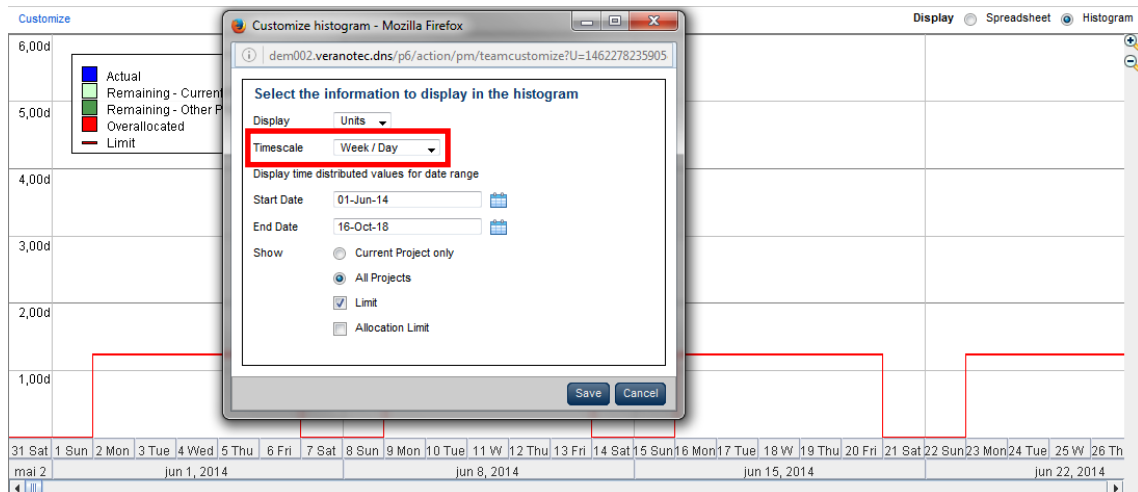


Para acessar esta função: Na página de Team Usage, clique em customizar.

## Opções adicionais na cópia de projetos

O P6 16.1 inclui opções adicionais ao copiar projetos.

Na caixa de diálogo da cópia de projetos, você poderá selecionar Riscos, Documentos e Relacionamentos apenas entre as atividades copiadas. Assim ao clicar em cada uma destas caixas, estes dados serão copiados com o projeto. Por exemplo, ao clicar em riscos, os riscos são copiados, ao clicar em “somente entre as atividades copiadas”, apenas os links entre as atividades do projeto serão copiados (neste exemplo, relacionamentos externos são desconsiderados)

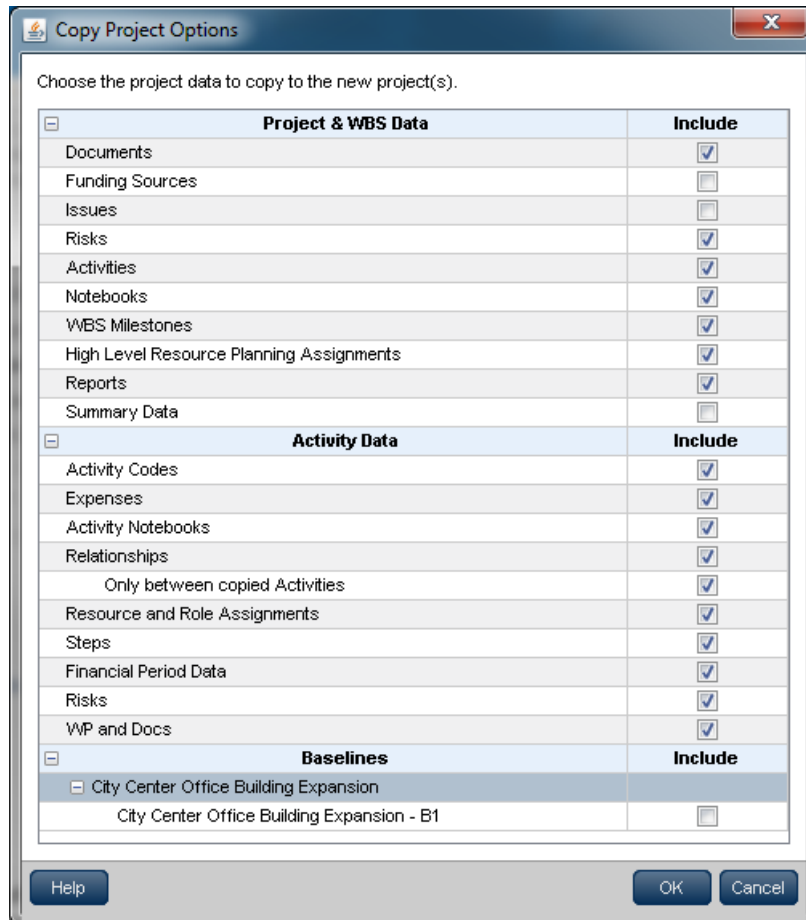

	Include
<b>Project &amp; WBS Data</b>	
Documents	<input checked="" type="checkbox"/>
Funding Sources	<input type="checkbox"/>
Issues	<input type="checkbox"/>
Risks	<input checked="" type="checkbox"/>
Activities	<input checked="" type="checkbox"/>
Notebooks	<input checked="" type="checkbox"/>
WBS Milestones	<input checked="" type="checkbox"/>
High Level Resource Planning Assignments	<input checked="" type="checkbox"/>
Reports	<input checked="" type="checkbox"/>
Summary Data	<input type="checkbox"/>
<b>Activity Data</b>	
Activity Codes	<input checked="" type="checkbox"/>
Expenses	<input checked="" type="checkbox"/>
Activity Notebooks	<input checked="" type="checkbox"/>
Relationships	<input checked="" type="checkbox"/>
Only between copied Activities	<input checked="" type="checkbox"/>
Resource and Role Assignments	<input checked="" type="checkbox"/>
Steps	<input checked="" type="checkbox"/>
Financial Period Data	<input checked="" type="checkbox"/>
Risks	<input checked="" type="checkbox"/>
W/P and Docs	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Baselines</b>	
City Center Office Building Expansion	<input checked="" type="checkbox"/>
City Center Office Building Expansion - B1	<input type="checkbox"/>

Para acessar esta função: Na página de EPS, selecione um ou mais projetos, clique com o botão direito do mouse e selecione Recortar ou Copiar. Selecione um nó da EPS e com um clique com o botão direito do mouse, selecione Colar.

### Mostrar os Lags e tipos de relacionamentos na tabela de atividades.

O P6 16.1 permite que você veja os dados de Lags e Tipos de relacionamentos na tabela de atividades na página de atividades. Duas colunas, a Predecessor Details e a Successors Details, foram adicionadas à lista de colunas. Estas, são apenas de leitura mas mostram na mesma célula o ID das atividades, o tipo de relacionamento e o Lag de cada atividade sucessora ou predecessora. Esta característica é muito útil quando você precisa rapidamente encontrar atividades que possuam Lags nos relacionamentos.

ID/Code *	Name *	Predecessor Details	Successor Details
Found	Foundation		
EC1090	Begin Building Const...	EC1030: FS	EC1100: SS
EC1100	Site Preparation	EC1090: SS	EC1230: FS
EC1230	Excavation	EC1100: FS	EC1320: FS, EC1330: FS
EC1320	Install Underground W...	EC1230: FS	EC1340: FS
EC1330	Install Underground E...	EC1230: FS	EC1340: FS
EC1340	Form/Pour Concrete F...	EC1320: FS, EC1330: FS	EC1350: FS
EC1350	Concrete Foundation ...	EC1340: FS	EC1360: FS
EC1370	Backfill and Compact ...	EC1360: FS	EC1380: FS, EC1390: FS
EC1380	Foundation Phase Co...	EC1370: FS	


Para acessar esta função: Clique no ícone de customização de colunas na página de atividades.

## P6 Eventing no Application Settings

Os eventos são acionados pela criação/atualização de mudanças feitas a objetos suportados usando o P6, P6 EPPM Web Services ou a integração do P6 utilizando API. Quando uma mudança aciona um evento, o sistema de notificação de eventos manda uma mensagem do evento ao usuário. Os eventos são adicionados na página de Application Settings e esta função é especialmente necessária para os usuários Cloud, que não tem acesso à administração do P6.

Na página Application Settings, configure as opções de Eventos assim como os intervalos de mensagens, Configurações de conexão JMS e Serviços de Diretório. Na página de configuração, determine quais tipos de eventos serão habilitados:

- **Business Objects:** Acionado quando o P6, P6 EPPM Web Services ou o P6 Integration API é utilizado para atualizar ou criar objetos na base de dados. Por Exemplo: Atividades, EPS ou recursos.
- **Special Operations:** Acionado quando uma operação suportada ou Job Service é executado. Por Exemplo: cálculo da rede, sumarização, aplicar realizado ou publicação.

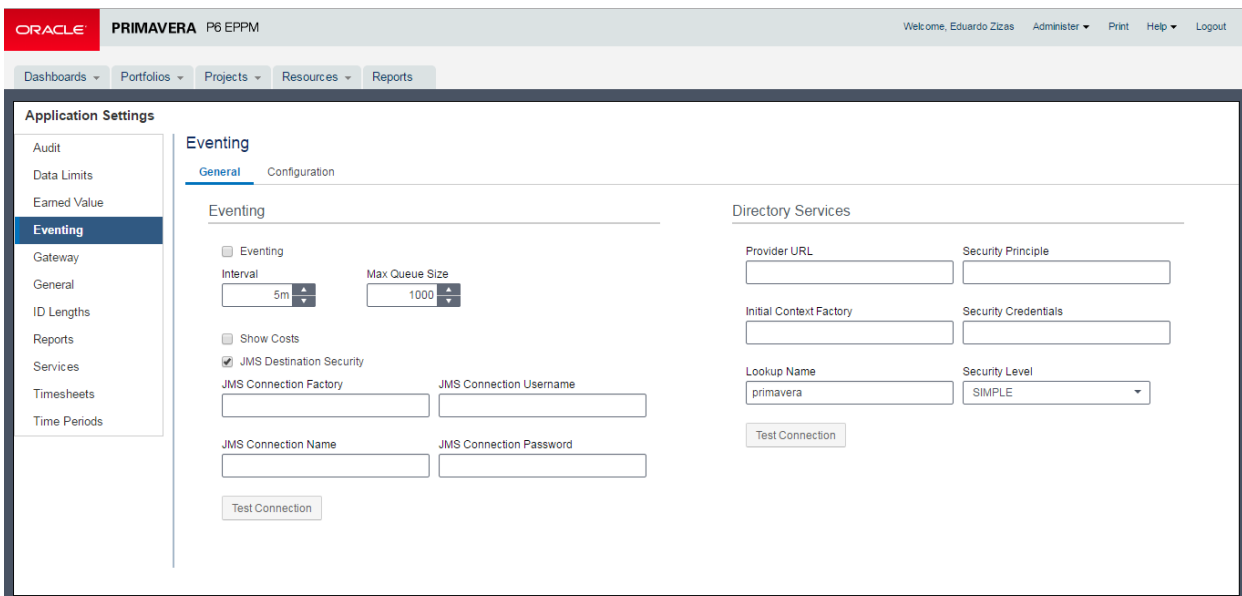

The screenshot shows the Oracle Primavera P6 EPPM Application Settings interface. The top navigation bar includes the Oracle logo, 'PRIMAVERA P6 EPPM', and user information: 'Welcome, Eduardo Zizas', 'Administer', 'Print', 'Help', and 'Logout'. Below the navigation bar are tabs for 'Dashboards', 'Portfolios', 'Projects', 'Resources', and 'Reports'. The main content area is titled 'Application Settings' and has a left sidebar with a menu: 'Audit', 'Data Limits', 'Earned Value', 'Eventing' (selected), 'Gateway', 'General', 'ID Lengths', 'Reports', 'Services', 'Timesheets', and 'Time Periods'. The 'Eventing' section is active, showing 'General' and 'Configuration' tabs. Under 'Eventing', there are checkboxes for 'Eventing' (unchecked), 'Show Costs' (unchecked), and 'JMS Destination Security' (checked). Below these are input fields for 'Interval' (set to 5m), 'Max Queue Size' (set to 1000), 'JMS Connection Factory', 'JMS Connection Username', 'JMS Connection Name', and 'JMS Connection Password'. A 'Test Connection' button is located at the bottom of this section. To the right, the 'Directory Services' section contains input fields for 'Provider URL', 'Security Principle', 'Initial Context Factory', and 'Security Credentials'. It also has a 'Lookup Name' field (set to 'primavera') and a 'Security Level' dropdown menu (set to 'SIMPLE'). A 'Test Connection' button is also present at the bottom of this section.


## Remoção dos Applets

A versão do P6 16.1 continuou o processo de remoção dos mini-aplicativos baseados em Java em troca por páginas com a codificação em HTML5. Estas páginas carregam mais rápido e não necessitam de plug-ins adicionais.

- As páginas de EPS e Atividades estão em HTML5 quando utilizando o modo Standard View, já a página de alocações de recursos está em HTML5 no modo Basic View.
- Algumas páginas que ainda estão baseadas em mini-aplicativos Java são chamadas de Classic View.

As seguintes páginas foram atualizadas na 16.1:

- Na página de atividades a funcionalidade em HTML5 foi adicionada no modo Standard View
- As páginas de EPS e Alocação de Recursos podem ser alteradas para uma visão baseada em HTML5.
- A caixa de diálogo Visualizar os Status dos Serviços agora é executada a partir do menu Administer, permitindo que você acesse a caixa de diálogo de qualquer página no P6.

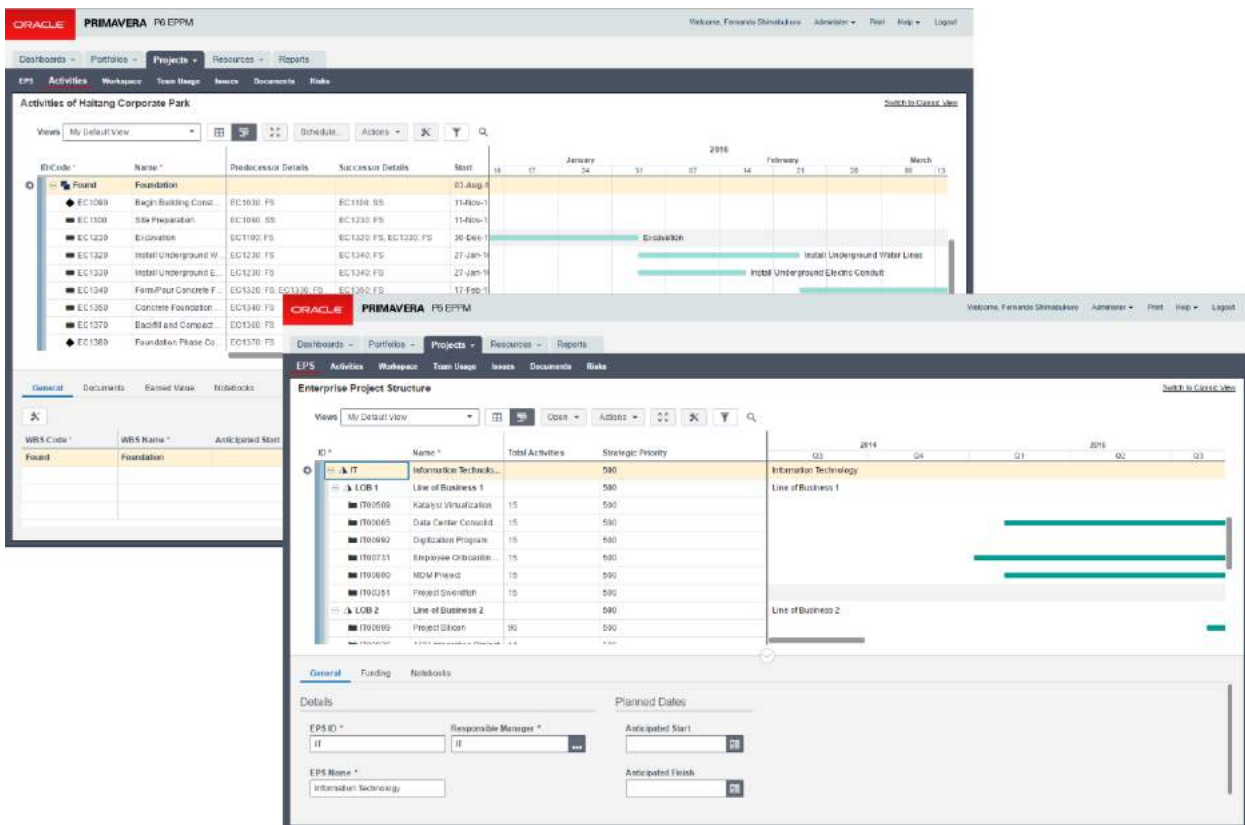

The screenshot displays the Primavera P6 EPPM interface. The top navigation bar includes 'Dashboards', 'Portfolios', 'Projects', 'Resources', and 'Reports'. The main content area is divided into two sections:

**Activities of Haining Corporate Park:** This section shows a Gantt chart for the year 2016. The chart displays various activities with their start and end dates. A table below the chart lists activity details:

Activity Code	Name	Predecessor Details	Successor Details	Start
EC1000	Foundation	EC1000: FS	EC1100: SS	03-Aug-16
EC1000	Begin Building Const...	EC1000: FS	EC1200: FS	11-Nov-16
EC1000	Site Preparation	EC1000: FS	EC1200: FS	11-Nov-16
EC1200	Excavation	EC1000: FS	EC1200: FS, EC1300: FS	20-Dec-16
EC1300	Install Underground W...	EC1200: FS	EC1300: FS	27-Jan-17
EC1300	Install Underground E...	EC1200: FS	EC1300: FS	27-Jan-17
EC1300	Form/Pour Concrete F...	EC1300: FS, EC1300: FS	EC1300: FS	17-Feb-17
EC1300	Concrete Foundation...	EC1300: FS		
EC1370	Backfill and Compact...	EC1300: FS		
EC1380	Foundation Phase Co...	EC1370: FS		

**Enterprise Project Structure:** This section shows a hierarchical view of the project structure. The main table lists activities and their strategic priorities:

Activity Code	Name	Total Activities	Strategic Priority
IT	Information Techno...	500	500
LOB 1	Line of Business 1	500	500
T00500	Katana Virtualization	15	500
T00605	Data Center Consolid...	15	500
T00602	Digitalize Progra...	15	500
T00731	Employee Onboardi...	15	500
T00800	MDM Project	15	500
T00251	Project Soverign	10	500
LOB 2	Line of Business 2	500	500
T00809	Project Silicon	30	500

Below the table, there are sections for 'Details' and 'Planned Dates'.

**Details:**

EPS ID: IT, Responsible Manager: IT, Anticipated Start: 28, EPS Name: Information Technology, Anticipated Finish: 28.

## Novas funcionalidades incrementadas na página de atividades no modo Standard View

Execute vários serviços, incluindo Apply Actuals e Summarize Projects.


Customize a aparência da página de atividades aplicando filtros, configurando opções de agrupamento, ordenando por colunas de atividades e então, salve a View.

Na tabela de atividades, use a seta do menu de ações para recortar, copiar e colar atividades ou níveis de WBS. Você também pode apagar uma WBS ou mesclar as atividades da WBS com o Item pai.

O painel de detalhes inclui novas abas:

- Nos detalhes de ATIVIDADES: Codes, Discussion, Documents, Expenses, Notebooks, Relationships, Risks, Steps
- Nos detalhes de WBS: General, Documents, Earned Value, Notebooks

Obs.: Na página de atividades a Standard View é a que fica habilitada por padrão no P6 16.1.

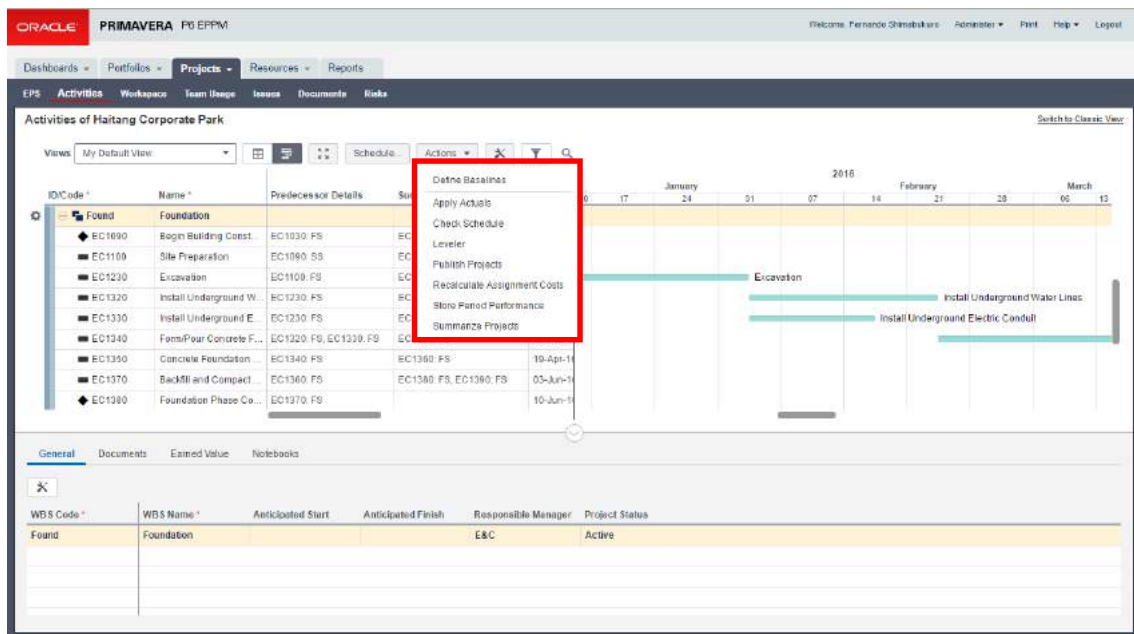

The screenshot displays the Primavera P6 EPPM interface. The main window shows a Gantt chart for 'Activities of Haitang Corporate Park' spanning from January to March 2016. A table on the left lists activities with columns for ID/Code, Name, Predecessor Details, and Start/End dates. A red box highlights the 'Actions' menu, which includes the following options: Define Baselines, Apply Actuals, Check Schedule Levels, Publish Projects, Recalculate Assignment Costs, Store Period Performance, and Summarize Projects. Below the Gantt chart, there are tabs for 'General', 'Documents', 'Earned Value', and 'Notebooks'. The 'General' tab is active, showing a table with columns for WBS Code, WBS Name, Anticipated Start, Anticipated Finish, Responsible Manager, and Project Status.

WBS Code	WBS Name	Anticipated Start	Anticipated Finish	Responsible Manager	Project Status
Found	Foundation			E&C	Active

Para acessar esta funcionalidade clique em atividades da barra de navegação de Projetos.



## Visão EPS no modo Standart View

O P6 16.1 proporciona na visão Standard View a página EPS em HTML5, o que permite um gerenciamento de projetos de modo cooperativo em um formato mais rápido e eficiente. Utilize a Standard View para gerenciar projetos e elementos de EPS, summarize e calcule (Schedule) projetos, customize a tabela com a lista de EPSs e Projetos no *layout*, edite as informações de projetos no painel de detalhes e visualize seus projetos em um gráfico de Gantt configurável. Mude a visão da página de EPS para o modo Classic View para executar tarefas mais complexas.

Na página User Interface View, habilite Classic View e/ou Standatd View e escolha uma delas como a visão padrão da página de EPS. A opção habilitada por padrão na 16.1 para a página de EPS é a Standard View.

1 – Utilize a barra de ferramentas para modificar e gerenciar os diferentes modos da página de EPS. Alterne entre uma visão de apenas tabela ou uma visão com tabela e gráfico de Gantt. Abra projetos, execute ações (Actions), habilite o modo “full screen”, abra a caixa de diálogo Customize View, imprima a visão corrente (somente a tabela) e gerencie filtros.


2 – No menu Actions, defina linhas de base, publique projetos, summarize projetos, feche todos ou libere o bloqueio “Exclusive”.

3 – O menu de ação de Linhas permite que você adicione, edite, abra, feche ou exclua projetos e também adicione, abra, feche e apague itens da EPS. Clique no ícone ou clique com o botão direito do mouse em cima de um projeto para acessar a caixa de diálogo de Preferências do Projeto.

4 – Edite as informações de EPS ou Projetos no painel de detalhes.

5 – O Gráfico de Gantt fornece uma representação visual de seus projetos. Customize as barras, rótulos, cores e a escala de tempo na caixa de diálogo Customize View.

6 – Alterne o modo de visão da página de EPS entre as visões Classic e Standard.

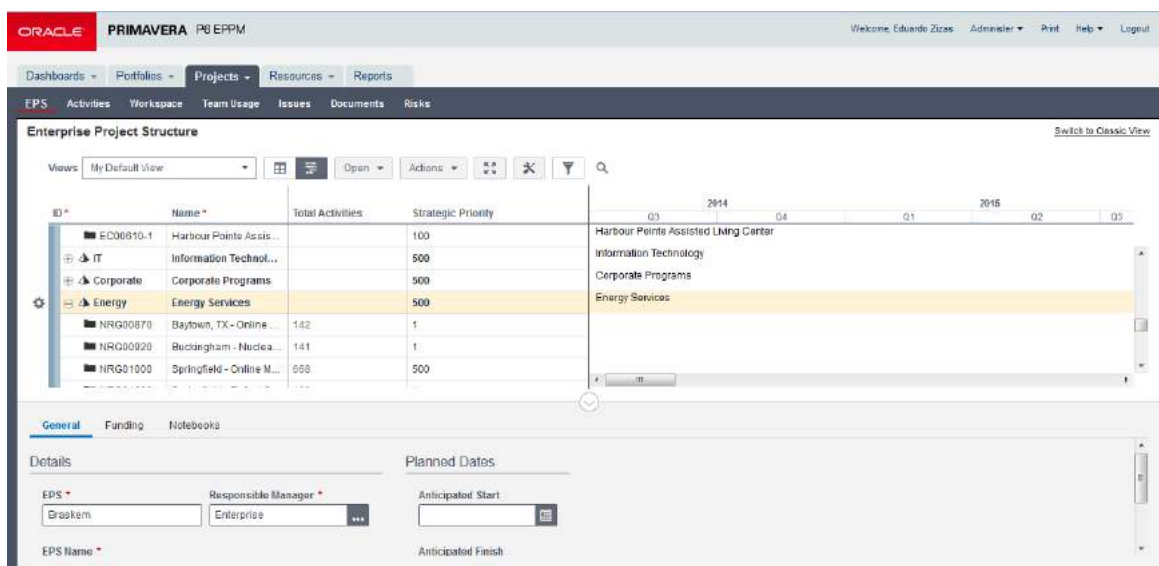

ID*	Name*	Total Activities	Strategic Priority
EC000910-1	Harbour Pointe Assis...		100
IT	Information Technol...		500
Corporate	Corporate Programs		500
Energy	Energy Services		500
NRG00870	Baytown, TX - Online ...	142	1
NRG00920	Buckingham - Nuclea...	141	1
NRG01000	Springfield - Online M...	668	500

Para acessar esta função: Clique em EPS na barra de navegação de Projetos.


## O modo Basic View na página de Alocação de Recursos

O P6 16.1 fornece uma visão simplificada no modo Basic View para a página de alocação de recursos (Resource Assignments). Utilize o modo Basic View para analisar/editar valores de unidades e custos, e atribuir/alterar recursos ou roles diretamente na página, sem a necessidade de navegar para diferentes áreas do P6. Exiba o Gráfico de Gantt para mostrar graficamente as alocações. Agrupe, ordene e filtre a lista de recursos e configure também as colunas exibidas na tabela.

Altere para o modo Classic View da página de alocação de recursos para executar tarefas mais complexas.

Na página User Interface View, habilite Classic View e/ou Basic View e escolha uma delas como a visão padrão da página de Alocação de Recursos.

- 1 – Utilize a barra de ferramentas para alternar entre uma visão de tabela apenas ou uma visão com tabela e gráfico de Gantt. Habilite o modo Full Screen, abara a caixa de diálogo Customize View, imprima a visão corrente (somente na visão tabela) e gerencie os filtros.
- 2 – Atribua recursos e roles e edite os campos de dados na própria tabela.
- 3 – O Gráfico de Gantt fornece uma representação visual de seus recursos. Customize as barras, rótulos, cores, escala de tempo e as linhas utilizando a caixa de diálogo “Customize View”.
- 4 – Alterne entre os modos Classic e Basic View na página de alocação de recursos.

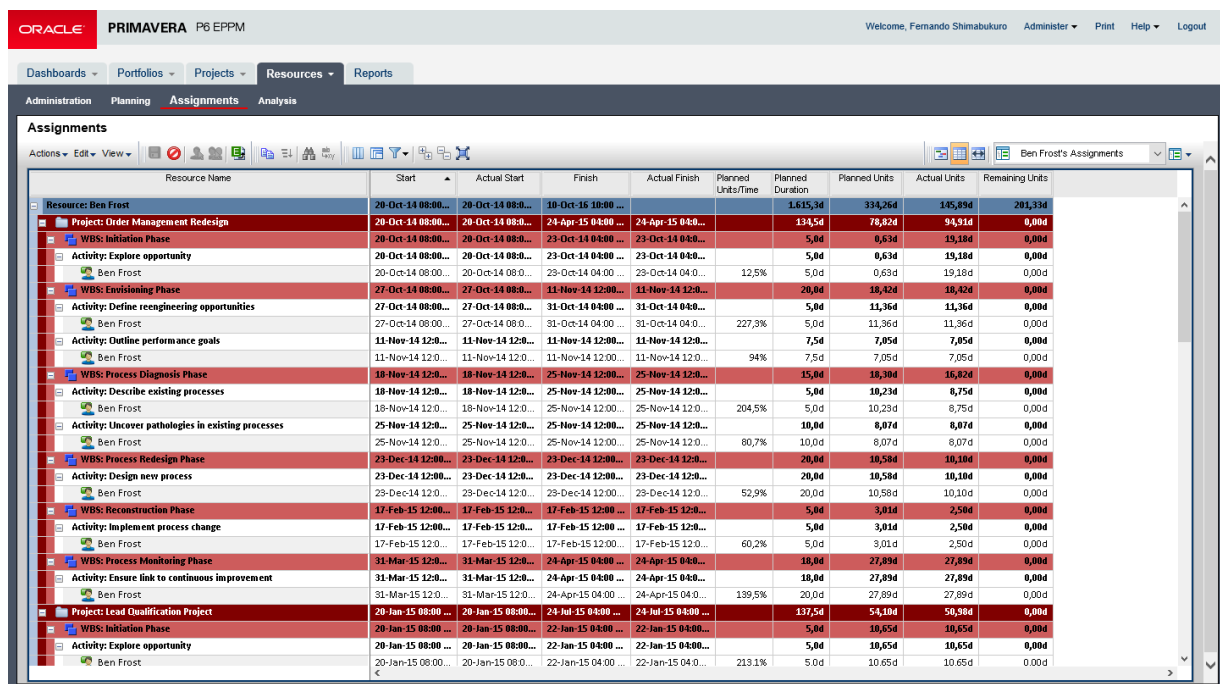

Resource Name	Start	Actual Start	Finish	Actual Finish	Planned Units/Time	Planned Duration	Planned Units	Actual Units	Remaining Units
<b>Resource: Ben Frost</b>	29-Oct-14 08:00...	29-Oct-14 08:00...	10-Oct-15 10:00...		1,615,34		374,264	145,894	201,334
<b>Projects: Order Management Redesign</b>	20-Oct-14 08:00...	20-Oct-14 08:00...	24-Apr-15 04:00...	24-Apr-15 04:00...			134,54	78,824	94,914
WBS: Initiation Phase	20-Oct-14 08:00...	20-Oct-14 08:00...	23-Oct-14 04:00...	23-Oct-14 04:00...			5,00	0,630	15,180
Activity: Explore opportunity	20-Oct-14 08:00...	20-Oct-14 08:00...	23-Oct-14 04:00...	23-Oct-14 04:00...			5,00	0,630	15,180
Ben Frost	20-Oct-14 08:00...	20-Oct-14 08:00...	23-Oct-14 04:00...	23-Oct-14 04:00...	12,5%		5,00	0,630	19,180
WBS: Envisioning Phase	27-Oct-14 08:00...	27-Oct-14 08:00...	11-Nov-14 12:00...	11-Nov-14 12:00...			20,00	18,420	18,420
Activity: Define reengineering opportunities	27-Oct-14 08:00...	27-Oct-14 08:00...	31-Oct-14 04:00...	31-Oct-14 04:00...			5,00	11,360	11,360
Ben Frost	27-Oct-14 08:00...	27-Oct-14 08:00...	31-Oct-14 04:00...	31-Oct-14 04:00...	227,3%		5,00	11,360	11,360
Activity: Outline performance goals	11-Nov-14 12:00...	11-Nov-14 12:00...	11-Nov-14 12:00...	11-Nov-14 12:00...			7,50	7,050	7,050
Ben Frost	11-Nov-14 12:00...	11-Nov-14 12:00...	11-Nov-14 12:00...	11-Nov-14 12:00...	94%		7,50	7,050	7,050
WBS: Process Diagnosis Phase	18-Nov-14 12:00...	18-Nov-14 12:00...	25-Nov-14 12:00...	25-Nov-14 12:00...			15,00	18,300	16,820
Activity: Describe existing processes	18-Nov-14 12:00...	18-Nov-14 12:00...	25-Nov-14 12:00...	25-Nov-14 12:00...			5,00	10,230	8,750
Ben Frost	18-Nov-14 12:00...	18-Nov-14 12:00...	25-Nov-14 12:00...	25-Nov-14 12:00...	204,5%		5,00	10,230	8,750
Activity: Uncover pathologies in existing processes	25-Nov-14 12:00...	25-Nov-14 12:00...	25-Nov-14 12:00...	25-Nov-14 12:00...			10,00	8,070	8,070
Ben Frost	25-Nov-14 12:00...	25-Nov-14 12:00...	25-Nov-14 12:00...	25-Nov-14 12:00...	80,7%		10,00	8,070	8,070
WBS: Process Redesign Phase	23-Dec-14 12:00...	23-Dec-14 12:00...	23-Dec-14 12:00...	23-Dec-14 12:00...			20,00	10,580	10,100
Activity: Design new process	23-Dec-14 12:00...	23-Dec-14 12:00...	23-Dec-14 12:00...	23-Dec-14 12:00...			20,00	10,580	10,100
Ben Frost	23-Dec-14 12:00...	23-Dec-14 12:00...	23-Dec-14 12:00...	23-Dec-14 12:00...	52,9%		20,00	10,580	10,100
WBS: Reconstruction Phase	17-Feb-15 12:00...	17-Feb-15 12:00...	17-Feb-15 12:00...	17-Feb-15 12:00...			5,00	3,010	2,500
Activity: Implement process change	17-Feb-15 12:00...	17-Feb-15 12:00...	17-Feb-15 12:00...	17-Feb-15 12:00...			5,00	3,010	2,500
Ben Frost	17-Feb-15 12:00...	17-Feb-15 12:00...	17-Feb-15 12:00...	17-Feb-15 12:00...	60,2%		5,00	3,010	2,500
WBS: Process Monitoring Phase	31-Mar-15 12:00...	31-Mar-15 12:00...	24-Apr-15 04:00...	24-Apr-15 04:00...			18,00	27,890	27,890
Activity: Ensure link to continuous improvement	31-Mar-15 12:00...	31-Mar-15 12:00...	24-Apr-15 04:00...	24-Apr-15 04:00...			18,00	27,890	27,890
Ben Frost	31-Mar-15 12:00...	31-Mar-15 12:00...	24-Apr-15 04:00...	24-Apr-15 04:00...	139,5%		20,00	27,890	27,890
<b>Project: Lead Qualification Project</b>	20-Jan-15 08:00...	20-Jan-15 08:00...	24-Jul-15 04:00...	24-Jul-15 04:00...			137,50	54,100	50,980
WBS: Initiation Phase	20-Jan-15 08:00...	20-Jan-15 08:00...	22-Jan-15 04:00...	22-Jan-15 04:00...			5,00	10,650	10,650
Activity: Explore opportunity	20-Jan-15 08:00...	20-Jan-15 08:00...	22-Jan-15 04:00...	22-Jan-15 04:00...			5,00	10,650	10,650
Ben Frost	20-Jan-15 08:00...	20-Jan-15 08:00...	22-Jan-15 04:00...	22-Jan-15 04:00...	213,1%		5,00	10,650	10,650

Para acessar esta função: Clique em Assignments na barra de navegação de Recursos.



**Verano Engenharia de Sistemas**

Rua Sud Menucci 309 - Vila Mariana

São Paulo - SP - Brasil - CEP 04017-080

Tel. 55 11 4506.2800 / Fax. 55 11 5579.5802

[www.verano.com.br](http://www.verano.com.br)

